(01)월 사업장 보건관리 상태보고서

사업장명 : (주)케이티엠오에스남부-대구본부

결재				

☐ 일반 현황

근로자현황(계약인원)	217명 (사무직 : 46명, 비사무직 : 171명)
산업재해 발생현황	재해자수 : 0명 (사망 : 명 / 부상 : 명 / 직업병 : 명 / 작업 관련성 : 명) 발생일 :
	2026년 산업재해 승인내역 : 총 0명 (사망 : 명 / 부상 : 명 / 직업병 : 명 / 작업 관련성 : 명)

☐ 업무수행내용

구 분		업 무 수 행 내 용
안전보건관리체계		■ 안전보건관리체계구축 ☐ 안전보건관리규정 ☐ 산업안전보건위원회 ☐ 도급시 안전보건조치 ☐ 기타
위험성평가		☐ 위험성평가 ☐ 실시 ☐ 지도 ☐ TBM등 결과 공유 ☐ 직업성 질병자 보건수칙 지도) ☐ 기타
안전보건교육		☐ 교육계획수립 ☐ 정기안전보건교육 (☐ 근로자 ☐ 관리감독자) ☐ 직무교육
		☐ 채용시 교육 ☐ 작업변경 시 교육 ☐ 특별안전보건교육 ☐ 기타
작업환경관리		☐ 작업환경측정 (☐ 실시 ☐ 지도 ☐ 초과)
		☐ 일반환경 ■ 안전보건표지 ☐ 보호구 ■ 물질안전보건자료 ☐ 특별관리물질 ☐ 기타
		■ 밀폐공간작업 ☐ 환기&국소배기 ☐ 소음·진동 ■ 화학·분진 ■ 온·습도·방사선·기타
		☐ 작업환경관리 장비활용:0종 0건
작업관련질환예방		☐ 근골격계질환 예방관리 ☐ 직무스트레스 예방관리 ☐ 뇌심혈관질환 예방관리 ☐ 기타
건강관리	건강진단 및 사후관리	☐ 실시 ☐ 지도 2025년 검진현황 D1(0), D2(3), DN(0), C1(0), C2(9), CN(0)
		☐ 건강진단 사후지도 ☐ 기타
		☐ 건강진단 장비활용 ☐혈압 0 건 ☐혈당 0 건 ☐콜레스테롤 0 건 ☐체지방 0 건
		☐기타 0 건 (장비명 :)
		☐ 건강장해원인조사 및 재발방지지도 ☐ 업무적합성평가 지도 ☐ 기타
	근로자건강증진	☐ 건강증진운동 지도 ☐ 건강증진지수평가 ☐ 기타
	기타	☐ 응급처치활동 및 응급대응체계구축 ☐ 구급함 점검 관리 ☐ 감염병 예방관리 ☐ 기타
보건관련프로그램		■ 밀폐공간작업 프로그램 ☐ 청력보존 프로그램 ☐ 호흡기보호 프로그램
		☐ 근골격계질환 프로그램 ☐ 건강증진 프로그램 ☐ 기타
자료제공		☐ 기술자료 배포 (협회자료: 종 기타: 종) ■ 기타

※ 점검내용에 따른 세부 기술지도사항은 사업장관리카드 19번 참조 바랍니다.

☐ 준비 및 특기사항

26년 연간보건관리계획 수립 및 지도
동절기 한파안전 5대 기본수칙 이행으로 건강장해 예방하시기 바랍니다.
밀폐공간 질식재해 예방 강화를 위한 산업안전보건기준에 관한 규칙 개정('25.12.1) 안내
안전보건관리책임자 내부결재 예정

방 문 일 자	2026-01-15	차기방문 예정일	2026-03-16
사업장 확인	직위 : 현장경영팀(과장) 성명 : 류재하	보건관리자	직종 : 산업위생 성명 : 장정인 장정인

대한산업보건협회
KOREAN INDUSTRIAL HEALTH ASSOCIATION

18. 위탁업무수행일지

(주)케이티엠오에스남부-대구본부

연도	방문일자	업무수행자		업무수행내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개 선	진 행	미개선	
2026	01-15	산업위생	장정인	안전보건관리체계 구축	**산업안전보건법 제15조(안전보건관리책임자)** **안전보건관리책임자는 안전・보건관리전문기관 상태 보고서의 개선의견에 따른 안전・보건상의 조치가 이행될 수 있도록 보고서에 자필로 서명**하여야 하며, **사업주**(「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 **경영책임자 등**을 포함할 수 있다)**에게 제출**하여야 합니다. 또한 유해・위험요인의 확인 및 개선 시 대책의 적절성, **개선 진행 상황 및 개선 완료 여부를 주기적으로 검토・확인**하여야 하며 위험요소의 제거・대체, 공학적・행정적 통제, 개인 보호구 제공 여부 등을 검토하여 **위험성이 합리적인 수준 이하로 감소 되도록 관리**하여야 합니다.(중대법 시행령 제4조 관련) ○ 안전·보건관리전문기관 및 재해예방 전문지도기관 관리규정에 따라 보건관리전문요원의 상태보고서에 안전보건관리책임자가 실명으로 서명 협조바랍니다. -안전보건관리책임자 부재 등 불가피한 사유로 인해 서명이 곤란하여 담당자 서명으로 요청하여 9월, 11월 상태보고서(위생기사) 안전보건관리책임자 내부결재 확인하였습니다. -보건관리상태보고서에 대한 보건관리 지도 내용을 개선 및 이행되도록 조치 바랍니다. -분리사업장으로 안전보건관리책임자 서명이 곤란하여 2026년 1월 15일 상태보고서는 보건업무 담당자 [류재하 대리]에게 서명받아 회신드리오니, 지도요원 차기 방문일에 해당보고서 결재 확인 바랍니다.	○			代
	01-15	산업위생	장정인	밀폐공간 작업	[밀폐공간]밀폐공간 **산업안전보건기준에 관한 규칙 제 623조 감시인의 배치** 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 작업 상황을 감시할 수 있는 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치하여야 한다. 감시인은 밀폐 공간에 종사하는 근로자에게 이상이 있을 경우에 **지체 없이 사업장 소재지를 관할하는 소방관서에 신고하고, 해당 소방관서의 장의 협조를 받아 적절한 조치를 한 후** 이를 즉시 **사업주 및 관리감독자에게 알려**야 한다 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 그 작업장과 외부의 감시인 간에 항상 연락을 취할 수 있는 설비를 설치하여야 한다 ○ 작업 시 감시인 배치 지도[안전보건규칙 개정('25.12.1)] - 밀폐공간 작업을 하는 동안 작업상황을 감시할 수 있는 감시인을 밀폐공간 외부에 배치하고 밀폐공간에 종사하는 근로자에게 이상이 있을 경우에 지체없이 관할 소방관서에 신고하고, 해당 소방관서의 장의 협조를 받아 적적한 조치를 한 후 이를 즉시 사업주 및 관리감독자에게 알리시기 바랍니다. 또한 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 그 작업장과 외부의 감시인 간에 항상 연락을 취할 수 있는 설비를 설치 바랍니다. - 출입 작업자와 감시인 성명을 작업허가서에 기재하시기 바랍니다.		○		代
	01-15	산업위생	장정인	법령요지	**산업안전보건법 제 34조(법령 요지 등의 게시)** 사업주는 이법과 이법에 따른 명령의 요지 및 안전보건관리규정을 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어 **근로자에게 널리 알려야 한다** ○ 2026년 산업안전보건법령 요지 게시 지도 - 상기 법령에 따라 안전보건교육에 관한 사항, 작업장 안전관리에 관한 사항, 작업장 보건관리에 관한 사항, 사고조사 및 대책수립에 관한 사항, 그 밖의 안전보건에 관한 사항을 근로자들이 알 수 있도록 지급받은 2026년 산업안전보건법 법령 요지를 게시하여 주시기 바랍니다.		○		代

연도	방문일자	업무수행자		업무수행내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인서명
		자격	성명			개선	진행	미개선	
2026	01-15	산업위생	장정인	법령요지	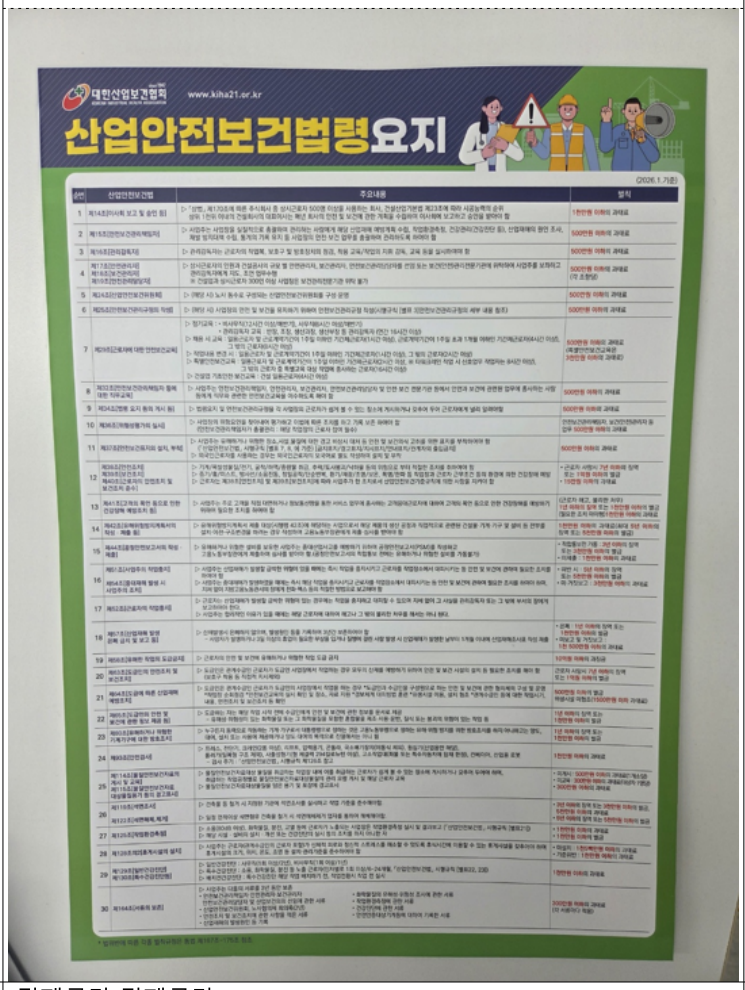				代
	01-15	산업위생	장정인	밀폐공간 작업	[밀폐공간]밀폐공간 **산업안전보건기준에 관한 규칙 제 641조 안전한 작업방법 등의 주지** 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 작업을 **시작하기 전**에 다음 각 호의 사항을 작업 근로자(제623조에 따른 감시인을 포함)에게 알려야 한다. 이 경우 사업주는 **작업근로자에 대하여 다음 각 호의 사항의 숙지여부를 확인하고 필요한 교육을 실시**해야 한다. **1. 밀폐공간의 위험성** **2. 산소 및 유해가스농도 측정에 관한 사항** **3. 환기설비의 가동 등 안전한 작업방법에 관한 사항** **4. 보호구의 착용과 사용방법에 관한 사항** **5. 사고 시 구조요청을 할 수 있는 관할 소방관서 등 비상연락처 및 응급조치에 관한 사항** **6. 제625조에 따른 대피용 기구의 위치 및 사용방법** ○ 밀폐공간 작업 전 안전한 작업방법 등의 주지 지도[안전보건규칙 개정('25.12.1)] - 밀폐공간작업 특별안전보건교육(최초교육) 외 밀폐공간 작업과 관련된 사항(응급처치방법, 안전한 작업방법 등)들에 대해 숙지가 미흡하여 산소결핍이나 가스 중독 등의 응급상황 발생 우려가 있으므로 작업 시작 전 작업근로자(감시인 포함)에게 아래의 사항을 참조하여 교육을 실시하시어 경각심을 고취시켜 주시기 바랍니다. 1. 밀폐공간의 위험성 2. 산소 및 유해가스농도 측정에 관한 사항 3. 환기설비의 가동 등 안전한 작업방법에 관한 사항 4. 보호구의 착용과 사용방법에 관한 사항 5. 사고 시 구조요청을 할 수 있는 관할 소방 관서 등 비상연락처 및 응급조치에 관한 사항 6. 대피용 기구의 위치 및 사용방법		○		代

<table>
<tr><th rowspan="2">연도</th><th rowspan="2">방문일자</th><th colspan="2">업무수행자</th><th rowspan="2">업무수행내역</th><th rowspan="2">문제점 및 개선지도 사항</th><th colspan="3">사업주 조치내용</th><th rowspan="2">사업주 확인 서명</th></tr>
<tr><th>자격</th><th>성명</th><th>개선</th><th>진행</th><th>미개선</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2026</td><td>01-15</td><td>산업위생</td><td>장정인</td><td>밀폐공간 작업</td><td>
<table>
<tr><td colspan="8">밀 폐 공 간 작 업 전 교 육</td></tr>
<tr><td>교육일시</td><td colspan="7">년 월 일 요일 시 분 ~ 시 분 (30분)</td></tr>
<tr><td>교육구분</td><td colspan="7">1. 신규채용자 교육(8시간 이상) 2. 작업내용 변경시 교육(2시간 이상)
3. 특별안전보건교육(16시간 이상) 4. 관리감독자 교육(연간 16시간 이상)
5. 근로자 정기교육(생산직: 매반기 12시간 이상, 사무직: 매반기 6시간 이상)
6. 기타교육(밀폐공간 작업 전 교육)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">교육인원</td><td>구 분</td><td>계</td><td>남</td><td>여</td><td colspan="3">비 고</td></tr>
<tr><td>밀폐공간 작업참일 작업자 및 감시자</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>교육자료</td><td>교안</td><td>○</td><td>TP</td><td></td><td>VTR</td><td></td><td>기타</td><td></td></tr>
<tr><td>교육목적</td><td colspan="7">밀폐공간 작업 시작 전 주지 교육</td></tr>
<tr><td>교육내용</td><td colspan="7">1. 밀폐공간의 위험성
2. 산소 및 유해가스농도 측정에 관한 사항
3. 환기설비의 가동 등 안전한 작업방법에 관한 사항
4. 보호구의 착용과 사용방법에 관한 사항
5. 사고 시 구조요청을 할 수 있는 관할 소방관서 등 비상연락처 및 응급조치에 관한 사항
6. 제625조에 따른 대피용 기구의 위치 및 사용방법</td></tr>
<tr><td rowspan="2">교육실시자 및 장소</td><td colspan="2">성 명</td><td colspan="2">직 명</td><td colspan="3">교육실시 장소</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">관리감독자</td><td colspan="3">현 장</td></tr>
<tr><td>특이사항</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">교육 참석자</td><td colspan="2">작 업 자</td><td colspan="2">서 명</td><td colspan="2">감 시 자</td><td colspan="2">서 명</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td><td>代</td></tr>
<tr><td>01-15</td><td>산업위생</td><td>장정인</td><td>기타</td><td>[(주)케이티엠오에스남부-대구본부]대구본사
○ 26년도 보건분야 업무계획수립지도
- 안전보건교육 : 정기교육-반기 12시간 실시/채용 시-8시간 이상 실시/특별교육-해당근로자 발생 시 실시(16시간이상)/관리감독자 교육-년 16시간 실시[2025년도 산재없을 시 1/2로 단축 가능]
- 위험성평가 : 매년실시
- 산업안전보건위원회 : 분기별 1회
- 근로자 건강검진 : 년 1회
- 작업환경측정 : 비대상
- 근골격계 유해요인조사 : 25년 4월 실시완료
- 안전보건관리책임자 보수 교육 : 2026. 8. 21 까지</td><td>○</td><td></td><td></td><td>代</td></tr>
<tr><td>01-15</td><td>산업위생</td><td>장정인</td><td>분진</td><td>* 미세먼지로 인한 건강장해 예방수칙을 게시하여 옥외작업자 보호에 활용하여주시기 바랍니다.
<미세먼지로 인한 건강장해 예방수칙>
1. 대기오염정보 수시 확인
- 미세먼지 농도 주의보/경보 발령현황 수시 확인(에어코리아, 구)우리동네대기정보 활용)
2. 마스크 지급, 착용 및 교육
- 옥외작업자 방진마스크(2급 이상) 또는 보건용마스크(KF80 이상) 제공
- 작업 전 옥외작업자에게 미세먼지 유해성 및 예방방법, 올바른 마스크 착용방법 교육
3. 옥외작업 최소화 관리</td><td>○</td><td></td><td></td><td>代</td></tr>
</table>

연도	방문일자	업무수행자		업무수행내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인서명
		자격	성명			개선	진행	미개선	
	01-15	산업위생	장정인	분진	- 미세먼지/초미세먼지 주의보나 경보 발령 시 옥외작업 최소화 - 민감군(임산부, 노약자, 뇌심혈관질환자, 호흡기 알레르기 질환자)은 미리 파악 후 옥외작업 단축 등 조치 4. 기타 건강관리 - 충분한 물섭취, 옥외 작업 후 손씻기와 위생관리 철저 [자료출처-안전보건공단, 고용노동부] 	○			代
2026	01-15	산업위생	장정인	밀폐공간 작업	[밀폐공간 질식재해 예방 강화를 위한 산업안전보건기준에 관한 규칙 개정 안내] 밀폐공간 질식사고 예방에 필요한 산소・유해가스 측정기 지급 등 사업주의 의무사항을 명확히 하고, 119 신고 의무를 명시하는 등 질식사고 예방 및 피해 확산을 방지하기 위함으로 주요 내용은 다음과 같으며 질식사고 위험작업 보유 사업장은 질식사고 예방 안전수칙을 철저히 준수하시기 바랍니다. * 질식사고 예방 핵심 안전보건규칙 개정('25.12.1) 주요내용 1. 사업주의 산소 및 유해가스 측정 장비 지급 명확화 - 밀폐공간 작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정이 제대로 이행되도록 사업주가 측정 장비를 측정자에게 지급하도록 의무를 명확히 함 2. 농도 측정 결과 등을 기록(영상물 포함)하고 3년간 보존 - 산소・유해가스 농도를 측정하고 적정공기 여부를 평가한 결과를 기록・보존하도록 함. 기록・보존은 영상물로도 가능 3. 사고 발생 시 지체없이 119 신고 - 감시인이 지체없이 119에 신고하여 신속하면서도 안전한 구조가 이루어지도록 함.(구조 과정에서 발생할 수 있는 추가 인명피해를 예방하기 위함) 4. 작업자의 밀폐공간 위험성 숙지 여부를 확인한 후 필요시 교육 - 사업주가 밀폐공간 위험성 및 안전수칙에 대한 작업자의 숙지 여부를 확인하고 필요한 사항을 교육하도록 법적 의무를 명확히 함 자료출처-고용노동부 보도자료(2025.12.01)	○			代

<table>
<tr><th rowspan="2">연도</th><th rowspan="2">방문
일자</th><th colspan="2">업무수행자</th><th rowspan="2">업무수행
내 역</th><th rowspan="2">문제점 및 개선지도 사항</th><th colspan="3">사업주 조치내용</th><th rowspan="2">사업주
확 인
서 명</th></tr>
<tr><th>자격</th><th>성명</th><th>개 선</th><th>진 행</th><th>미개선</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2
0
2
6</td><td>01-15</td><td>산업위생</td><td>장정인</td><td>밀폐공간
작업</td><td>고용노동부 보도자료
보도시점 2025. 12. 1.(월) 9:00 (2025. 12. 1.(월) 석간)

밀폐공간 질식재해 예방 강화를 위한
산업안전보건기준에 관한 규칙 개정・공포
- 사업주의 산소 및 유해가스 농도 측정장비 지급 의무를 명확화
- 작업자가 밀폐공간의 위험성 및 안전수칙을 숙지하도록 교육을 강화하고, 사고 발생 시 지체없이 119에 신고토록 규정

고용노동부(장관 김영훈)는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 개정안을 12월 1일(월) 공포・시행했다.
이번 개정안은 밀폐공간 질식사고 예방에 필요한 산소・유해가스 측정기 지급 등 사업주의 의무사항을 명확히 하고, 119 신고 의무를 명시하는 등 질식사고 예방 및 피해 확산을 방지하기 위함이다.
12월 1일 공포・시행된 개정안의 주요 내용은 다음과 같다
<1> 사업주의 산소 및 유해가스 측정 장비 지급 명확화
밀폐공간 작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정이 제대로 이행되도록 사업주가 측정 장비를 측정자에게 지급하도록 의무를 명확히 했다.
<2> 농도 측정 결과 등을 기록(영상물 포함)하고 3년간 보존
산소・유해가스 농도를 측정하고 적정공기 여부를 평가한 결과를 기록・보존하도록 했다. 아울러, 기록・보존은 영상물로도 가능하다.
<3> 사고 발생 시 지체없이 119 신고
감시인이 지체없이 119에 신고하여 신속하면서도 안전한 구조가 이루어지도록 했다. 구조 과정에서 발생할 수 있는 추가 인명피해를 예방하기 위한 것이다.
<4> 작업자의 밀폐공간 위험성 숙지 여부를 확인한 후 필요시 교육
사업주가 밀폐공간 위험성 및 안전수칙에 대한 작업자의 숙지 여부를 확인하고 필요한 사항을 교육하도록 법적 의무를 명확히 했다.
아울러, 고용노동부는 개정안의 시행과 함께 질식사고 위험작업 보유 사업장(동절기 건설현장 포함)을 대상으로 질식사고 예방 안전수칙 준수를 적극 안내・홍보할 예정이다.
* 겨울철 건설현장은 저수조・정화조 등의 내부 작업뿐만 아니라, 콘크리트 양생 작업 시 일산화탄소 중독에 의한 질식사고 위험이 높아 특히 주의 필요
❖ 콘크리트 양생을 위해 보양 후, 그 내부에서 갈탄・목탄(숯탄)・연탄 등의 화석연료 사용 시 일산화탄소 등 유해가스로 인한 질식사고 위험으로 밀폐공간 작업에 해당(질식재해 예방조치 없이 갈탄・목탄・연탄 사용금지)
→ 화석연료 대신 전기열풍기 사용 적극 권장
* 연료교체 등 작업 시 공기호흡기 또는 송기마스크 착용이 필수, 갈탄 등에서 치명적인 농도의 일산화탄소 등 유해가스 발생
직업환경의학 전문의인 류현철 산업안전보건본부장은 "이번 안전보건규칙 개정은 밀폐공간 질식사고 사례를 살펴 재해예방에 꼭 필요한 부분을 찾아 보완한 것임"을 강조하면서,
"사업주가 법적 의무를 충실히 이행할 수 있도록, 고용노동부는 안전교육 및 재정지원을 확대하고 현장 지도·감독을 강화하겠다"라고 밝혔다.
<table><tr><td rowspan="2">담당 부서</td><td rowspan="2">산업안전보건정책관
산업보건기준과</td><td>책임자</td><td>과 장</td><td>박종일 (044-202-8870)</td></tr><tr><td>담당자</td><td>서기관
주무관</td><td>윤현욱 (044-202-8873)
이승철 (044-202-8875)</td></tr><tr><td rowspan="2">담당 부서</td><td rowspan="2">안전보건감독국
건설산재예방감독과</td><td>책임자</td><td>과 장</td><td>황효정 (044-202-8935)</td></tr><tr><td>담당자</td><td>연구관
주무관</td><td>민병윤 (044-202-8943)
김진수 (044-202-8941)</td></tr></table>대한민국 정책브리핑 OPEN</td><td>○</td><td></td><td></td><td>代</td></tr>
<tr><td>01-15</td><td>산업위생</td><td>장정인</td><td>밀폐공간
작업</td><td>산업안전보건기준에 관한 규칙 제 625조 대피용 기구의 비치
사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 공기호흡기 또는 송기마스크, 사다리 및 섬유로프 등 비상시에 근로자를 피난시키거나 구출하기 위하여 필요한 기구를 갖추어 두어야 한다.

○ 대피용 기구 보유 지도
- 밀폐공간에서 작업하는 근로자가 산소결핍이나 유해가스로 인하여 추락할 우려가 있는 경우 안전대, 구명밧줄, 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하고 착용하도록 관리 바랍니다.
* 호흡보호구의 선정·사용 및 관리에 관한 지침[KOSHA GUIDE H-82-2020] 호흡보호구(마스크) 착용 방법 참고 바랍니다.
- 안전대나 구명밧줄등을 착용하도록 하는 경우 올바르게 착용하여 작업 실시 할수 있도록 작업전 충분한 교육(작업시작전 교육,특별교육, 긴급구조훈련 등)을 실시하여 주시기 바랍니다.</td><td></td><td>○</td><td></td><td>代</td></tr>
<tr><td>01-15</td><td>산업위생</td><td>장정인</td><td>밀폐공간
평가</td><td>[밀폐공간]밀폐공간
산업안전보건기준에 관한 규칙 제 619조 밀폐공간 작업 프로그램의 수립, 시행<table><tr><th>밀폐공간작업프로그램 내용</th><th>작업 전 확인 사항 및 게시 사항</th></tr><tr><td>사업장내 밀폐공간의 위치파악 및 관리방안</td><td>작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보</td></tr><tr><td>밀폐공간 내 질식, 중독 등을 일으킬 수 있는 유해, 위험요인의 파악 및 관리 방안</td><td>관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보</td></tr><tr><td>작업 전 사전 확인 사항에 대한 확인절차</td><td>산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항</td></tr><tr><td>안전보건교육 및 훈련</td><td>작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출・유입・발생 가능성 검토 및 후속조치 사항</td></tr><tr><td>그 밖에 밀폐공간 작업 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항</td><td>작업 시 착용하여야 할 보호구의 종류</td></tr><tr><td></td><td>비상연락체계</td></tr></table><2025.11.04> 밀폐공간작업프로그램 수립 지도
* 밀폐공간 작업 - 포스코 지하 컬버트장소에 설비고장 시 출입
- 2024년 6월 28일 밀폐공간작업 프로그램이 개정되었으며 환기량(체적의 5배 → 10배), 이산화탄소 소화설비 및 소화용기 안전조치, 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 자를 지정 등 지침 내 변경/추가된 사항을 반영하여 수립하시기 바랍니다.
* 밀폐공간작업 프로그램 수립 사항
1. 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안</td><td></td><td>○</td><td></td><td>代</td></tr>
</table>

연도	방문일자	업무수행자		업무수행내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개선	진행	미개선	
2026	01-15	산업위생	장정인	밀폐공간 평가	2. 밀폐공간 내 질식/중독 등을 일으킬 수 있는 유해/위험요인의 파악 및 관리 방안 3. 제2항에 따라 밀폐공간 작업 시 사전 확인이 필요한 사항에 대한 확인 절차 4. 안전보건교육 및 훈련 5. 그 밖에 밀폐공간 작업 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 * 밀폐공간작업 프로그램 작업 전 안전보건 확인 조치 사항 1. 작업일시, 기간, 장소 및 내용, 작업내용 등 확인 2. 관리감독자, 노동자, 감시인 등 작업자 정보 및 근로자 특별안전보건교육, 작업방법 주지여부 확인 3. 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 4. 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출, 유입 발생 가능성 검토 및 후속조치 5. 작업 시 착용하여야 할 보호구 점검(안전대, 구명줄, 송기마스크 등) 6. 작업자, 외부감시인, 관리자 간 긴급 연락할 수 있는 통신수단 등 비상연락체계 수립 <2026.01.15> - 본사에서 26년 상반기 내 밀폐공간작업프로그램 수립예정임을 보건담당자와 확인하였으며 2025년 12월 1일 산업안전보건기준에 관한 규칙 밀폐공간작업 프로그램이 개정되었으며 '밀폐공간작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침' 이 변경(2024년 6월 28일)됨에 따라 지도요원 방문하여 지속적인 지도예정입니다.				代
	01-15	산업위생	장정인	밀폐공간 작업	[밀폐공간]밀폐공간 **산업안전보건기준에 관한 규칙 제 619조2 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 기록 등** ① 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 **작업을 시작(작업을 일시 중단하였다가 다시 시작하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 사람을 지정**하여 **측정장비를 지급**하고 그로 하여금 해당 **밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정**하여 적정공기가 유지되고 있는지를 평가하도록 해야 한다. ② 사업주는 제1항에 따라 **밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정 및 평가하는 자에 대하여 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항의 숙지여부를 확인하고 필요한 교육을 실시**해야 한다. **1. 밀폐공간의 위험성** **2. 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법** **3. 밀폐공간 내에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법** **4. 적정공기의 기준과 평가 방법** ③ 사업주는 제1항에 따라 산소 및 유해가스 농도를 측정한 결과 적정공기가 유지되고 있지 아니하다고 평가된 경우에는 작업장을 환기시키거나, 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하는 등 근로자의 건강장해 예방을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다 ④ 사업주는 제1항에 따른 **밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가 결과에 대하여 측정 및 평가한 사람의 성명, 측정 및 평가한 일시·장소 및 그 결과 등을 기록(영상정보처리기기를 활용 포함)하여 3년간 보존**해야 한다. ○ 밀폐공간 작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정 실시 지도 [안전보건규칙 개정('25.12.1)] - 밀폐공간 작업을 시작하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 자를 지정하여 해당 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정하여 적정공기가 유지되고 있는지 평가하도록 해야합니다. 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정 및 평가하는 자에 대하여 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항의 숙지여부를 확인하고 필요한 교육을 실시해야 합니다. 1. 밀폐공간의 위험성 2. 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법		○		代

<table>
<tr><th rowspan="2">연도</th><th rowspan="2">방문일자</th><th colspan="2">업무수행자</th><th rowspan="2">업무수행내역</th><th rowspan="2">문제점 및 개선지도 사항</th><th colspan="3">사업주 조치내용</th><th rowspan="2">사업주 확인 서명</th></tr>
<tr><th>자격</th><th>성명</th><th>개선</th><th>진행</th><th>미개선</th></tr>
<tr><td></td><td>01-15</td><td>산업위생</td><td>장정인</td><td>밀폐공간 작업</td><td>3. 밀폐공간 내에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법
4. 적정공기의 기준과 평가 방법
- 측정장비[복합가스측정기]는 구매가 아닌 렌탈로 진행 예정 확인되며 해당장비의 검교정 실시내역에 대한 서류를 보관하여 주시기 바랍니다.
- 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가 결과에 대하여 측정 및 평가한 사람의 성명, 측정 및 평가한 일시, 장소 및 그 결과 등을 기록(고정형, 이동형 영상정보처리기기 포함)하여 3년간 보존하시기 바랍니다.[예시자료 참고]
산소 및 유해가스 농도 측정기록 평가지(예시)
<table><tr><th rowspan="2">날짜</th><th rowspan="2">장소</th><th rowspan="2">시간</th><th colspan="5">산소 및 유해가스 농도</th><th rowspan="2">평가 결과</th><th rowspan="2">작성자 (측정자)</th></tr><tr><th>산소</th><th>이산화 탄소</th><th>일산화 탄소</th><th>황화 수소</th><th>기타</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
※ 측정기록은 일시 및 장소, 적정 공기여부, 측정자 등을 확인할 수 있는 자료(수기·엑셀·영상+음성 등)는 인정되며, 반드시 부서장의 결재를 받은 후 관리 필요</td><td></td><td></td><td></td><td>代</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>01-15</td><td>산업위생</td><td>장정인</td><td>물질안전보건자료</td><td>[(주)케이티엠오에스남부-대구본부]전 공정
산업안전보건법 제114조 시행규칙 제167조 물질안전보건자료를 게시하거나 갖추어 두는 방법
제공받은 물질안전보건자료를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.
게시 방법
1. 물질안전보건자료 대상 물질을 취급하는 작업 공정이 있는 장소
2. 작업장내 근로자가 가장 보기 쉬운 장소
3. 근로자가 작업 중 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치된 전산장비
[MSDS 제출의무 및 영업비밀 비공개 제도 유예 기간 종료(2026. 1. 16.) 안내]
1. 물질안전보건자료(MSDS) 제출 의무 및 영업비밀 비공개 승인 제도의 유예 기간 종료(2026. 1. 16.)
- 2026. 1. 16. 이후에는 유통되는 모든 물질안전보건자료(MSDS)에 제출 시 부여받은 제출번호가 기재되어야 하고, 영업비밀 보호가 필요한 경우 사전에 승인된 대체자료가 기재되어야 합니다.
- 연간 제조,수입량에 따른 유예기간: 1,000톤이상~'22.1.16. / 100톤이상 1,000톤 미만~'23.1.16. / 10톤이상 100톤미만~'24.1.16. / 1톤이상 10톤미만~'25.1.16. / 1톤미만~'26.1.16.

2. 2021년 1월 변경 시행된 물질안전보건자료 제도에 따라 제조업체에서 물질안전보건자료 안전보건공단 시스템 제출 시 MSDS 상에 공단 등록번호를 부여받아야 하는 것으로 법이 개정 되였습니다. 휘발유, 냉매 등 현장 내 취급하는 화학물질에 대한 MSDS는 공단 등록번호가 반영되어진 최신 개정된 자료를 확보하여 근로자가 쉽게 볼 수 있도록 게시 바랍니다.</td><td></td><td>○</td><td></td><td>代</td></tr>
</table>

연도	방문일자	업무수행자		업무수행내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인서명
		자격	성명			개선	진행	미개선	
2026	01-15	산업위생	장정인	물질안전보건자료	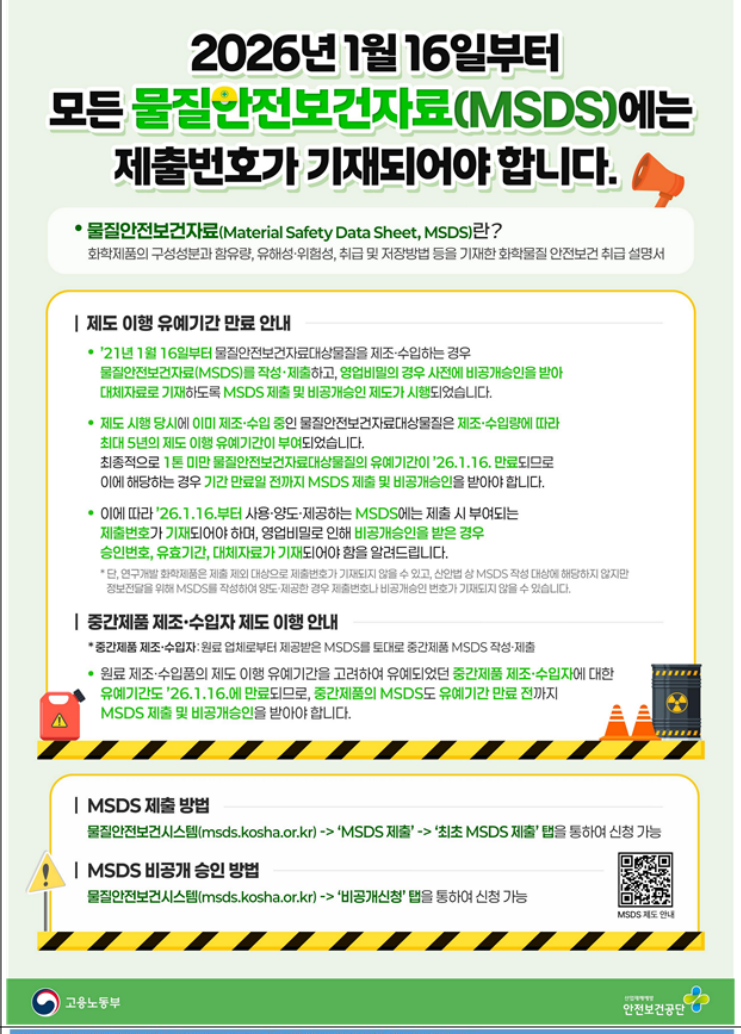				代
	01-15	산업위생	장정인	안전보건관리체계 구축	**산업안전보건법 제14~24조(안전보건관리체제 등)** **사업주 또는 경영책임자 등은** 사업주나 법인 또는 기관이 **실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여** 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자가 같은 조에서 규정한 각각의 **업무를 각 사업장에서 충실히 수행할 수 있도록** 해당 **업무 수행에 필요한 권한과 예산**을 주어야 하며 해당 **업무를 충실하게 수행하는지를 평가하는 기준을 마련**하고, 그 기준에 따라 **반기 1회 이상 평가·관리**하여야 합니다(중대법 시행령 제4조 관련) <2025.07.17> 중대재해처벌법 업무수행에 따른 정기적인 이행 점검 철저 지도 - 지도생략 <2025.11.04> 중대재해처벌 등에 관한 법률에 의거 반기 1회 점검 확인 - 사업장 내 전직원들을 대상으로 근로자의 안전보건 역량 강화를 위한 평가를 실시하고 있음을 확인하였으며, 해당 평가 내용 및 결과에 따른 조치 등을 기록 및 보관 중입니다. - 6월 현장 및 사무실 안전보건점검을 실시하여 반기 1회 평가 활동이 주기적으로 이루어지고 있으며, 사업주 및 안전보건관리책임자 등의 내부 결재가 이루어지고 있습니다. - 하반기는 상반기 안전보건 실행계획 이행여부 확인 및 위험성평가 진행 내역 점검 등 12월에 실시예정 확인됩니다. <2026.01.15> 중대재해처벌 등에 관한 법률에 의거 하반기 점검 확인 - 25년 12월 상반기 안전보건 실행계획 이행여부 확인 및 위험성평가 진행 내역 점검 등 확인됩니다.	○			代

연도	방문일자	업무수행자		업무수행내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인 서명
		자격	성명			개선	진행	미개선	
2026	01-15	산업위생	장정인	안전보건 관리체계 구축	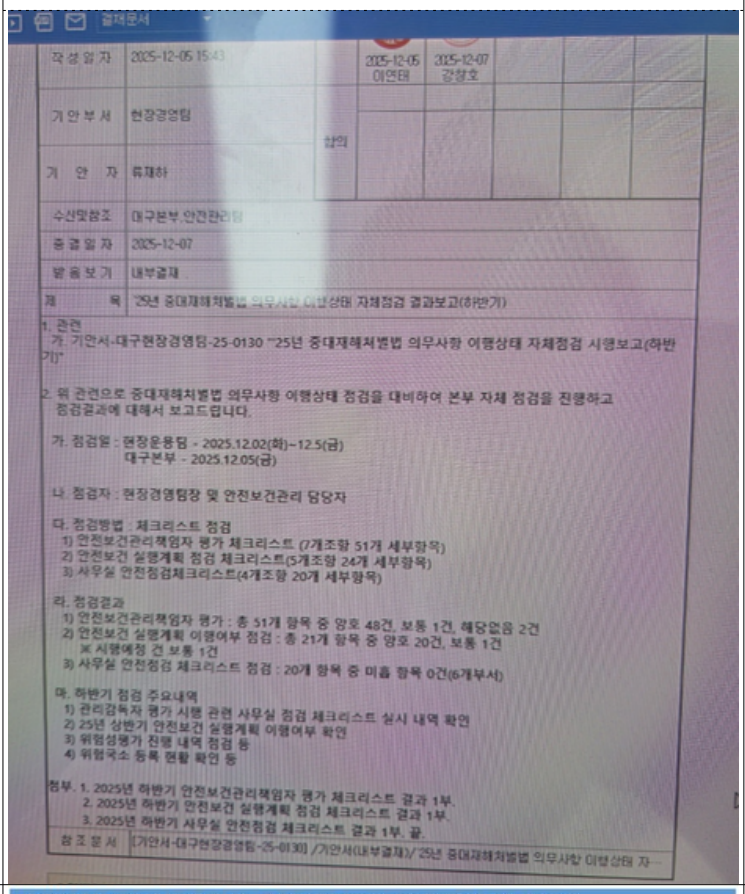 결재문서 작성일자 2025-12-05 15:43 / 2025-12-05 이연태 / 2025-12-07 강창호 기안부서 현장경영팀 기안자 류재하 합의 수신및참조 대구본부.안전관리팀 종결일자 2025-12-07 발송보기 내부결재 제목 '25년 중대재해처벌법 의무사항 이행상태 자체점검 결과보고(하반기) 1. 관련 가. 기안서-대구현장경영팀-25-0130 "'25년 중대재해처벌법 의무사항 이행상태 자체점검 시행보고(하반기)" 2. 위 관련으로 중대재해처벌법 의무사항 이행상태 점검을 대비하여 본부 자체 점검을 진행하고 점검결과에 대해서 보고드립니다. 가. 점검일 : 현장운용팀 - 2025.12.02(화)~12.5(금) 대구본부 - 2025.12.05(금) 나. 점검자 : 현장경영팀장 및 안전보건관리 담당자 다. 점검방법 : 체크리스트 점검 1) 안전보건관리책임자 평가 체크리스트 (7개조항 51개 세부항목) 2) 안전보건 실행계획 점검 체크리스트(5개조항 24개 세부항목) 3) 사무실 안전점검체크리스트(4개조항 20개 세부항목) 라. 점검결과 1) 안전보건관리책임자 평가 : 총 51개 항목 중 양호 48건, 보통 1건, 해당없음 2건 2) 안전보건 실행계획 이행여부 점검 : 총 21개 항목 중 양호 20건, 보통 1건 ※ 시행예정 건 보통 1건 3) 사무실 안전점검 체크리스트 점검 : 20개 항목 중 미흡 항목 0건(6개부서) 마. 하반기 점검 주요내역 1) 관리감독자 평가 시행 관련 사무실 점검 체크리스트 실시 내역 확인 2) 25년 상반기 안전보건 실행계획 이행여부 확인 3) 위험성평가 진행 내역 점검 등 4) 위험국소 등록 현황 확인 등 첨부. 1. 2025년 하반기 안전보건관리책임자 평가 체크리스트 결과 1부. 2. 2025년 하반기 안전보건 실행계획 점검 체크리스트 결과 1부. 3. 2025년 하반기 사무실 안전점검 체크리스트 결과 1부. 끝. 참조문서 [기안서-대구현장경영팀-25-0130] /기안서(내부결재)/ '25년 중대재해처벌법 의무사항 이행상태 자…	○			代
	01-15	산업위생	장정인	온습도	**산업안전보건기준에 관한 규칙 제 563조 한랭 장해 예방 조치** 사업주는 근로자가 한랭 작업을 하는 경우에 동상 등의 건강장해를 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. **1. 혈액순환을 원활히 하기 위한 운동 지도를 할 것** **2. 적절한 지방과 비타민 섭취를 위한 영양 지도를 할 것** **3. 체온 유지를 위하여 더운물을 준비할 것** **4. 젖은 작업복 등은 즉시 갈아입도록 할 것** * 동절기 한파안전 5대 기본수칙 이행 및 한랭질환 예방 사전 점검표를 통한 자체점검 실시하여 건강장해 예방하시기 바랍니다. <한파안전 5대 기본수칙> 1. 따뜻한 옷 및 방한 장구 착용 2. 따뜻한 쉼터(작업장소와 가까운) 설치로 한파특보 발령 시 적절한 휴식 부여 3. 깨끗하고 따뜻한 물 제공 4. 작업시간대 조정: 한파주의보 시 작업시간대 조정 또는 작업시간 단축, 한파경보시 추운시간대(새벽) 옥외 작업중지 또는 최소화 5. 119 신고: 한랭질환자 발생 시 즉시 119신고 / 한랭질환 증상 및 예방조치, 응급조치 요령을 미리 알릴 것 [자료출처-안전보건공단, 고용노동부]	○			代

연도	방문일자	업무수행자		업무수행내역	문제점 및 개선지도 사항	사업주 조치내용			사업주 확인서명
		자격	성명			개선	진행	미개선	
2026	01-15	산업위생	장정인	온습도	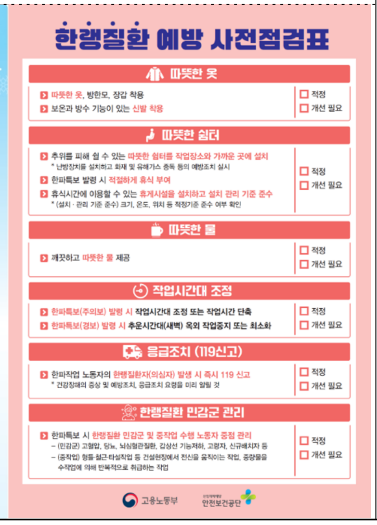	○			代

현장순회점검표

사업장명	(주)케이티엠오에스남부-대구본부	점검일	2026-01-15	
기관명	경북지역본부	점검자	직종 : 산업위생 성명 : 장정인	장정인
점검방법	기타	확인자	직위 : , 성명 :	

연번	공정	분야	점검항목	점검결과
1	밀폐공간	밀폐공간평가	밀폐공간작업 프로그램을 수립 및 시행하고 있는가?	미흡
2	밀폐공간	밀폐공간평가	밀폐공간작업 프로그램을 수립 및 시행하고 있는가?	미흡
